

APERTURA DE BITÁCORA

Datos de la obra

Contratante: Municipio de San Lorenzo Axocomanilla.

Contratista: Ing. Ricardo Alcocer Alcocer.

Obra: Rehabilitación de red para drenaje sanitario en privada guadalupe.

Ubicación: Priv. Guadalupe, San Lorenzo Axocomanilla.

Periodo de ejecución: 11 de mayo de 2026 al 9 de junio del 2026.

Meta: 82 ml de alcantarilla

Monto de contrato: \$125,657.27 + IVA

Contrato: DOPS4/FAISMUN/AD26/007

Supervisor asignado:

Director de obras del municipio de San Lorenzo Axocomanilla: Ing. Edgar Israel Avendaño Vázquez

Ing. Ricardo Alcocer Alcocer
Residente Supervisor de obraIng. Ricardo Alcocer Alcocer
ContratistaAna Zaira Patricia Menéndez de la Garza
Supervisor AsignadoIng. Edgar Israel Avendaño Vázquez
Director de obras públicasOBRAS
PÚBLICAS


Nota N° 1

Se inicia la obra que consiste en la rehabilitación de la red de drenaje Sanitario de la priv. Guadalupe.

Se preseta cuadrilla de trabajo para obtener niveles de anastre del drenaje y pozo existentes.




Ing. Ricardo Alcocer Alcocer
Residente de obra




Ara. Zaira Patricia Méndez de la Garza
Supervisor de obra asignado

Nota N° 2


Se obtiene el siguiente levantamiento de niveles de pozos existentes y nivel de anastre de la tubería existente.

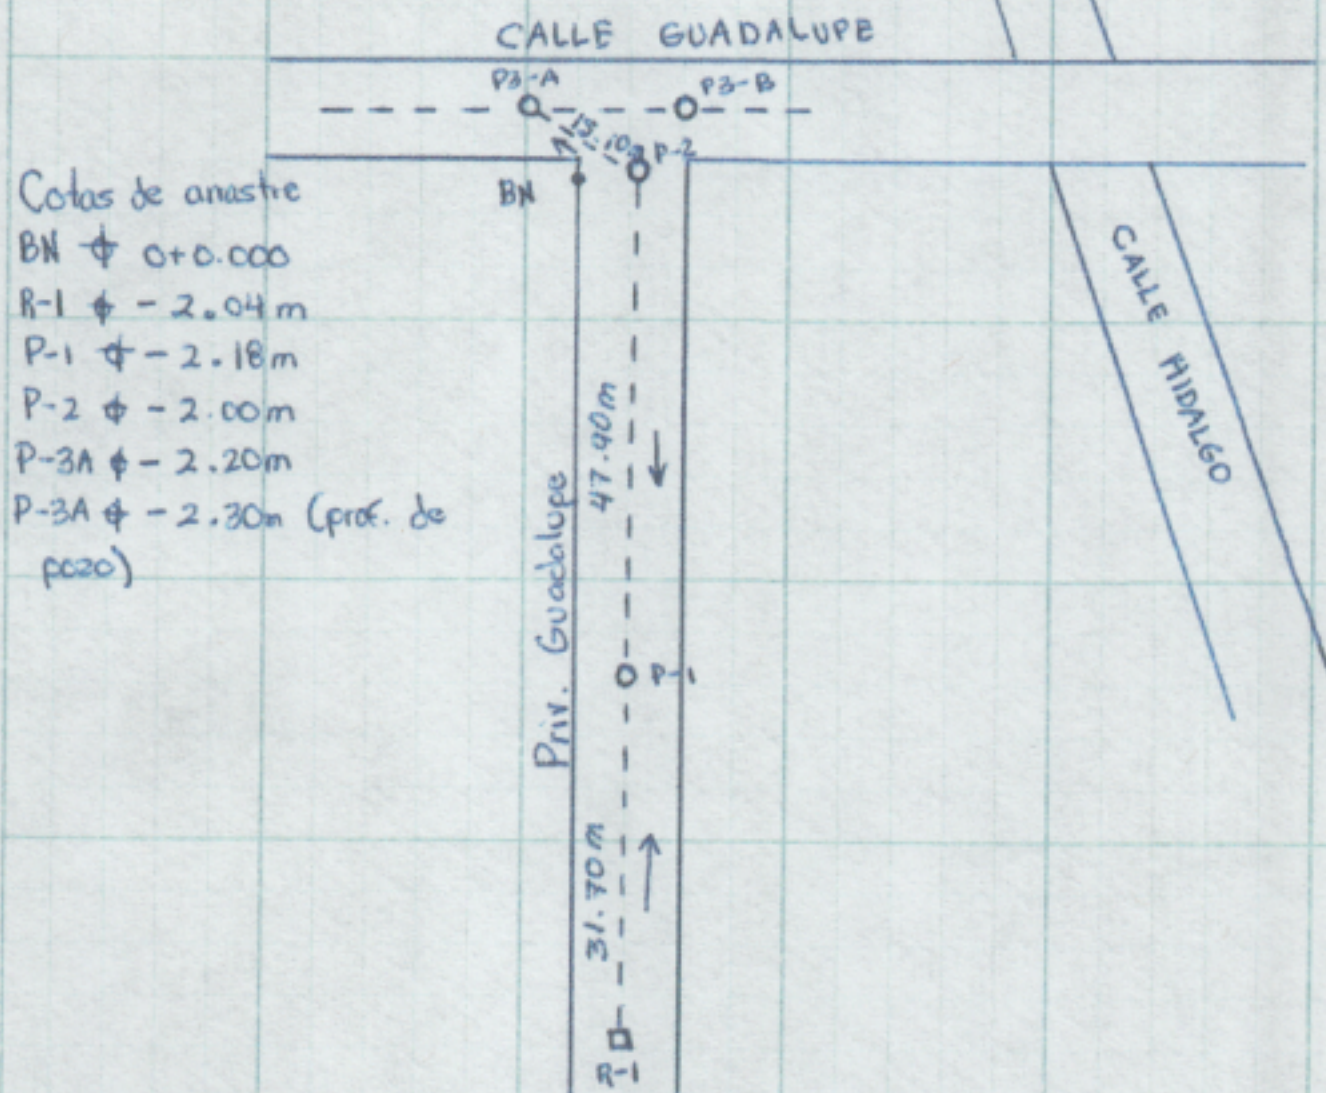

Dicha información recolectada fue validada por el supervisor de obra asignado.



Ing. Ricardo Alcocer Alcocer
Residente de obra




Ara. Zaira Patricia Méndez de la Garza
Supervisor de obra Asignado

Nota N°3

De acuerdo a lo descrito en la nota N°2 se informa el mal funcionamiento de la red existente. Las pendientes no cumplen con porcentajes mínimos para el funcionamiento adecuado. Se forma un parte aguas en el pozo denominado P-1. La red trabaja bajo la condición de tubo lleno.




Ing. Ricardo Alcocer Alcocer
Presidente de obra




Arq. Zaira Patricia Méndez de la Garza
Supervisor de obra Asignado

Nota N°4

Se le solicita a dirección la autorización para tomar la cota de anastie de R-1 y la cota de anastie de pozo P-3A para lograr una diferencia de altura de 26 cm en el tramo de 99.70 m. con pendiente del 0.27%. Y todos los trabajos extraordinarios que deriven de dicha consideración. De otra manera no se cumplirá con pendiente para el funcionamiento de la Rehabilitación.



Ing. Ricardo Alcocer Alcocer
Presidente de obra.



Arq. Zaira Patricia Méndez de la Garza
Supervisor de obra Asignado
