Transformando Axocomanitla
Gobierno Municipal 2024 - 2027

MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA

2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CLAVE EXPEDIENTE:	FINAL	DOP54/FAISMUN/AD26/007
FECHA ELAB.:	30 de junio de 2026	
MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA	
LOCALIDAD	SAN LORENZO AXOCOMANITLA	
UBICACIÓN:	PRIVADA CALZADA GUADALUPE	
ENTRE:	ANTIGUO CAMINO A NATIVITAS Y CALLE HIDALGO	
NOMBRE:	REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA CALZADA GUADALUPE.	
DESCRIPCION CONSISTENTE DE METAS:	La red de conducción y desalojo recolecta las aguas residuales para conducirlas a pozos, plantas de tratamiento o zonas de residuos.	
UNIDAD MEDIDA:	METROS	
CANTIDAD:	82	
TIPO DE PROYECTO	PIR	PROYECTO DE IMPACTO REGIONAL
TIPO DE OBRA	DRE	RED DE DRENAJE SANITARIO
RUBRO DE GASTO	DRE	DRENAJE Y LETRINAS
INCIDENCIA DE LA OBRA	DIR	DIRECTA
MODALIDADES POR TIPO DE OBRA	R	REHABILITACIÓN
BENEF. DIRECTOS:	20	
HAB. DE LOCALIDAD:	6320	
ERAL:	$ 188,021.57	
ESTATAL:	$ -	
BENEFICIARIOS:	$ -	
MUNICIPIO:	$ -	
COSTO TOTAL:	$ 188,021.57	
TOTAL PRESUPUESTO:	$ 188,021.57	
APORTACION BENEF:	NINGUNA	
MODALIDAD EJECUCION :	CONTRATO	
FECHA INICIO:	11 de mayo de 2026	
FECHA TERMINO:	9 de julio de 2026	
PRESIDENTA MPAL:	LIC. GABRIELA HERNÁNDEZ MONTIEL PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	
DIRECTOR DE OBRAS:	ING. EDGAR ISRAEL AVENDAÑO VÁZQUEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	

OPERADO FISM

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LORENZO AXOCOMANITLA
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LORENZO AXOCOMANITLA
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LORENZO AXOCOMANITLA
2024 - 2027
SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LORENZO AXOCOMANITLA
2024 - 2027
OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA

2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Transformando Axocomanitla
Gobierno Municipal 2024 - 2027

EXPEDIENTE TÉCNICO

FINAL

CLAVE: DOP54/FAISMUN/AD26/007

FECHA DE ELABORACIOI 30 de junio de 2026

OPERADO FISM

A.- UBICACIÓN

MUNICIPIO: SAN LORENZO AXOCOMANITLA

LOCALIDAD: SAN LORENZO AXOCOMANITLA

UBICACIÓN: PRIVADA CALZADA GUADALUPE
ANTIGUO CAMINO A NATIVITAS Y CALLE HIDALGO

ENTRE:

B.- OBRA A REALIZAR

NOMBRE: REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA CALZADA GUADALUPE.

DESCRIPCIÓN DE METAS:

La red de conducción y desalojo recolecta las aguas residuales para conducirlas a pozos, plantas de tratamiento o zonas de residuos.

UNIDAD DE MEDIDA: METROS **CANTIDAD:** 82.00

C.- APERTURA PROGRAMÁTICA

TIPO DE PROYECTO	PIR	PROYECTO DE IMPACTO REGIONAL
TIPO DE OBRA	DRE	RED DE DRENAJE SANITARIO
RUBRO DE GASTO	DRE	DRENAJE Y LETRINAS
INCIDENCIA DE LA OBRA	DIR	DIRECTA
MODALIDADES POR TIPO DE OBRA	R	REHABILITACIÓN

D.- BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 20 **HAB. DE LA LOCALIDAD:** 6320

E.- INVERSIÓN

TOTAL	0 FEDERAL	0 ESTATAL	0 BENEFICIARIOS	MUNICIPIO
188,021.57	188,021.57	0.00	0.00	0.00

FORMA DE APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS: NINGUNA

F.- EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATO

PERIODO: INICIO-TERMINO **DEL:** 11 de mayo de 2026 **AL:** 9 de junio de 2026

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 SÍNDICO MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 OBRAS PÚBLICAS

LIC. GABRIELA HERNÁNDEZ MONTIEL
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. EDGAR ISRAEL AVENDAÑO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

2.- CROQUIS DE LA LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

			FINAL
MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA		DOP54/FAISMUN/AD26/007
LOCALIDAD:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA		
OBRA:	REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA CALZADA GUADALUPE		
UBICACIÓN:	PRIVADA CALZADA GUADALUPE		
ENTRE:	ANTIGUO CAMINO A NATIVITAS Y CALLE HIDALGO		


OPERADO
FISM

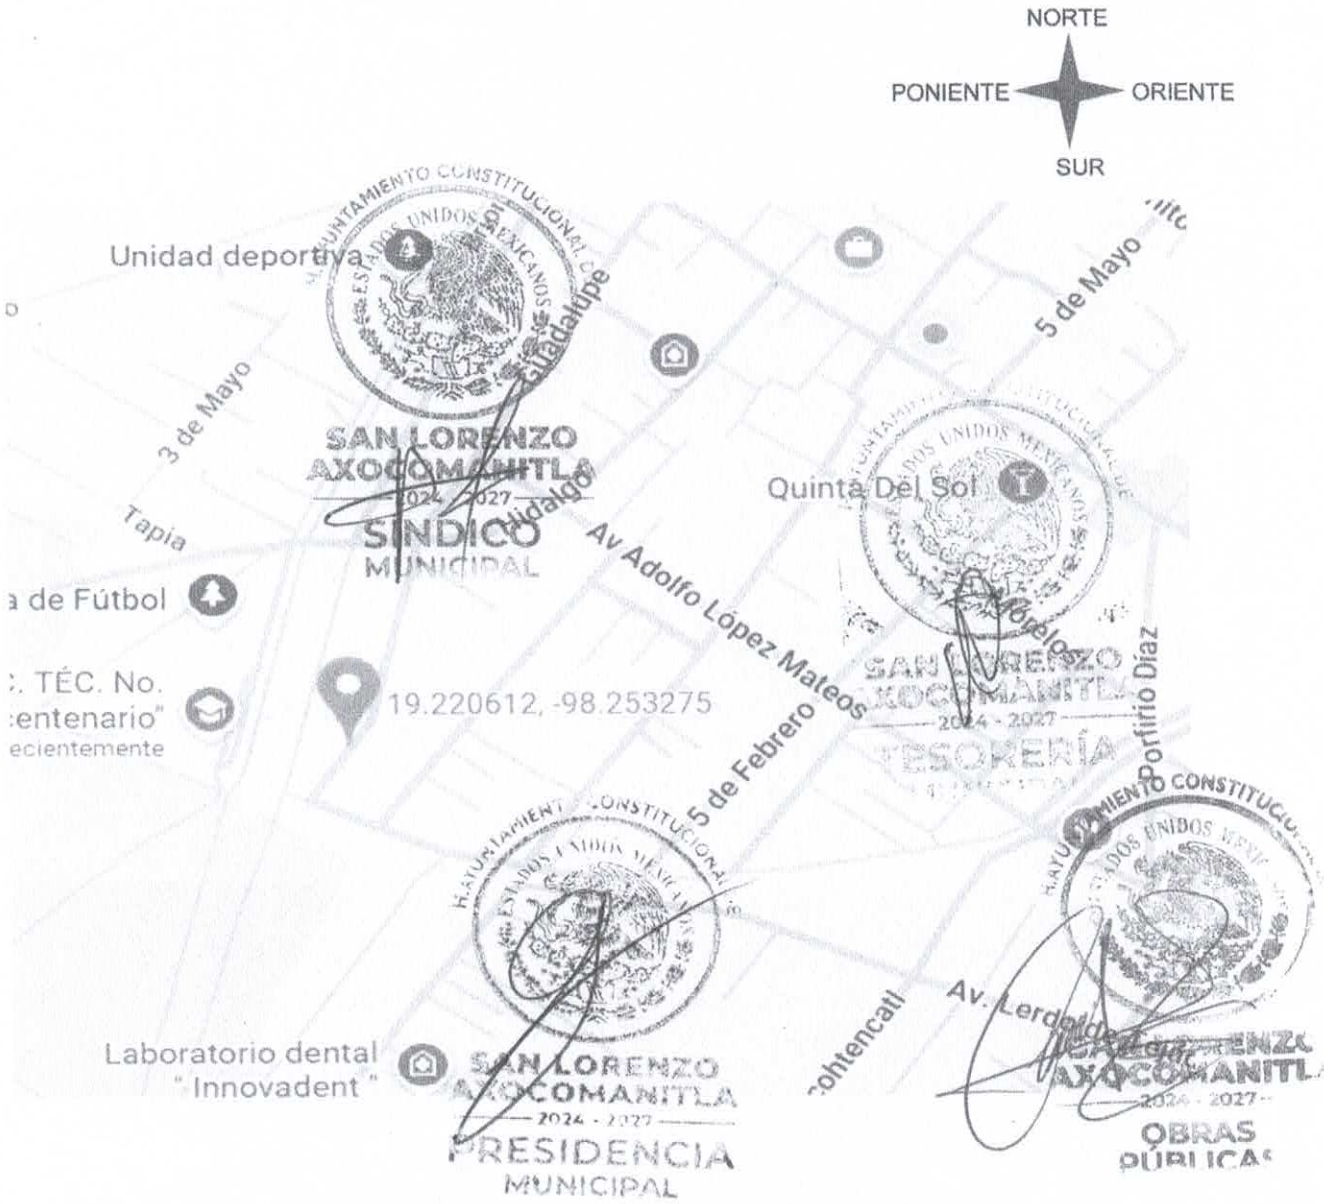

3.- CROQUIS DE LA OBRA

			FINAL
MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA		DOP54/FAISMUN/AD26/007
LOCALIDAD:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA		
OBRA:	REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA CALZADA GUADALUPE.		
UBICACIÓN:	PRIVADA CALZADA GUADALUPE		
ENTRE:	ANTIGUO CAMINO A NATIVITAS Y CALLE HIDALGO		

OPERADO
FISM

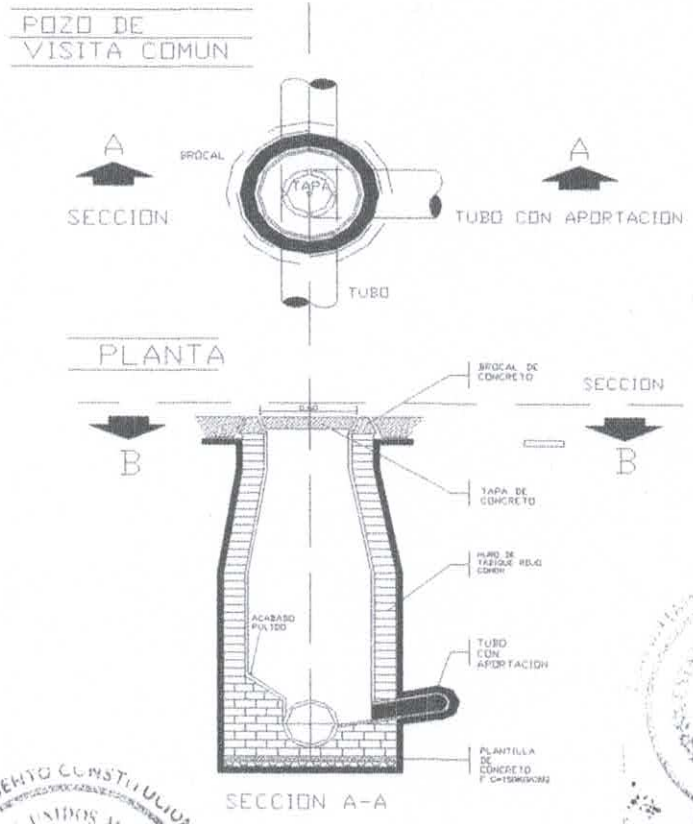

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LORENZO AXOCOMANITLA
2024 - 2027
SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LORENZO AXOCOMANITLA
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LORENZO AXOCOMANITLA
2024 - 2027
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LORENZO AXOCOMANITLA
2024 - 2027
OBRAS PÚBLICAS

4.- PRESUPUESTO DE LA OBRA

				FINAL
	MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA		DOP54/FAISMUN/AD26/007
	LOCALIDAD:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA		
	OBRA:	REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA CALZADA GUADALUPE.		
	UBICACIÓN:	PRIVADA CALZADA GUADALUPE		
	ENTRE:	ANTIGUO CAMINO A NATIVITAS Y CALLE HIDALGO		

	CONCEPTO O PARTIDA	U. DE M.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	PRELIMINARES				**$ 26,522.18**
1	TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: EQUIPÓ, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	93.05	$ 12.69	$ 1,180.80
2	EXCAVACIÓN EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES, MATERIAL SECO, TIPO II, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	116.35	$ 89.36	$ 10,397.04
3	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO LIGERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	108.16	$ 120.33	$ 13,014.89
4	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL NO UTILIZABLE (PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O RETIROS Y/O DEMOLICIONES), FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	8.83	$ 218.56	$ 1,929.65
	DRENAJE				**$ 91,630.95**
5	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYE ACARREO A SITIO AUTORIZADO POR PARTE DEL MUNICIPIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA EJECUCION	M	66.65	$ 60.23	$ 4,014.35
6	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CON MANGUERA DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENO COMPACTADO, RETIRO, REPOSICIÓN DE TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	TOMA	10.00	$ 326.96	$ 3,269.60
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO N-8 DE 6" DE DIÁMETRO, NORMA "NOM-001-CNA-1995" PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS LOCALES, EXCAVACIONES, CONEXIÓN A RED, RELLENOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	DESCARGA	5.00	$ 2,288.00	$ 11,440.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO N-8 DE 6" DE DIÁMETRO, NORMA "NOM-001-CNA-1995" INCLUYE: LIGA-EMPAQUE, PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LABORATORIO, FLETES, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M	92.05	$ 504.25	$ 46,416.21
9	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 M. A TIZÓN APL. PULIDO, DESPLANTE CONCRETO SIMPLE ESCALONES, DIAM. DE 0.60 A 0.90 M PROF. A RASANTE. HIDR. 1.50 M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	2.00	$ 6,718.97	$ 13,437.94
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO PARA POZOS DE VISITA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	3.00	$ 3,326.95	$ 9,980.85
11	CONEXIÓN A RED MUNICIPAL O POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	$ 2,479.79	$ 2,479.79
12	DEMOLICION DE REGISTRO SANITARIO DE 60 X 60 X 100 CM , INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	PZA	1.00	$ 600.23	$ 600.23
	EXTRAORDINARIOS				**$ 43,926.43**
EXT-1	EXTRACCIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES ESTANCADAS EN POZOS Y ATARJEA MEDIANTE EL USO DE MOTOBOMBA TRAGA SÓLIDOS. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	HR	6.00	$ 453.66	$ 2,721.96

OPERADO FISM

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 SINDICO MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 TESORERIA MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 OBRAS PÚBLICAS

4.- PRESUPUESTO DE LA OBRA

				FINAL
	MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA		DOP54/FAISMUN/AD26/007
	LOCALIDAD:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA		
	OBRA:	REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA CALZADA GUADALUPE.		
	UBICACIÓN:	PRIVADA CALZADA GUADALUPE		
	ENTRE:	ANTIGUO CAMINO A NATIVITAS Y CALLE HIDALGO		

	CONCEPTO O PARTIDA	U. DE M.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
EXT-2	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON MANGUERA DE ALTA DENSIDAD, 36 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENO COMPACTADO, RETIRO, REPOSICIÓN DE TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$ 1,010.06	$ 1,010.06
EXT-3	LIMPIEZA, RETIRO DE ACUMULACIÓN DE SOLIDOS Y RENIVELACIÓN DE FONDO DE POZO DE VISITA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	$ 479.24	$ 479.24
EXT-4	DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA ESPESOR DE 14 CM INCLUYE: EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3.20	$ 214.36	$ 685.95
EXT-5	DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE SECCION 14X50 CM, INCLUYE: EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	5.60	$ 100.03	$ 560.17
EXT-6	RETIRO CON RECUPERACIÓN Y RECOLOCACIÓN DE ADOQUÍN INCLUYE: NIVELACION, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	19.50	$ 198.79	$ 3,876.41
EXT-7A	FABRICACIÓN DE BANQUETA DE 14 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3.20	$ 400.54	$ 1,281.73
EXT-7B	FABRICACIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE SECCION 14X50 CM, INCLUYE: CIMBRA POR AMBAS CARAS, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	5.60	$ 389.76	$ 2,182.66
EXT-8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHECK DE 12" PARA ALCANTARILLADO, INCLUYE: FABRICACIÓN DE REGISTRO SECCIÓN 1.20 X 0.80 X 0.60 M A BASE DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR, MUROS DE TABIQUE, ACABADO PULIDO, TAPA DE CONCRETO ARMADO, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$ 28,252.35	$ 28,252.35
EXT-9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26, IMPRESO EN VINIL LOS DATOS DE LA OBRA, TAMAÑO DE 30X45 CM CON DISEÑO Y COLORES OTROGADOS POR EL MUNICIPIO.	PZA	1.00	$ 648.32	$ 648.32
EXT-10	DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS, CINTURÓN DE CONCRETO EXISTENTES, INCLUYE: ACARREO DISTANCIA MÁXIMA DE 10 M., TRASPALEOS HORIZONTALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	9.00	$ 34.11	$ 306.99
EXT-11	CONSTRUCCIÓN DE CINTURÓN DE CONCRETO SIMPLE, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 10 X 25 CM DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRADO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	9.00	$ 213.40	$ 1,920.60
				SUBTOTAL	$ 140,897.56
				IVA	$ 21,934.01
				TOTAL	$ 162,831.57

OPERADO
FISM

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 SÍNDICO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

ING. EDGAR ISRAEL AVENDAÑO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 OBRAS PÚBLICAS

5.- RESUMEN DE CONCEPTOS

			FINAL
	MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA	DOP54/FAISMUN/AD26/007
	LOCALIDAD:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA	
	OBRA:	REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA CALZADA GUADALUPE.	
	UBICACION:	PRIVADA CALZADA GUADALUPE	
	ENTRE:	ANTIGUO CAMINO A NATIVITAS Y CALLE HIDALGO	

CONCEPTO Ó PARTIDA		IMPORTE $
PRELIMINARES	$	30,765.73
DRENAJE	$	106,301.18
EXTRAORDINARIOS	$	50,954.66
TOTAL	$	188,021.57

OBRA PAGADO
FISM

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 OBRAS PÚBLICAS

6.- CALENDARIO DE EJECUCIÓN

				FINAL
	MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA		DOP54/FAISMUN/AD26/007
	LOCALIDAD:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA		
	OBRA:	REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA CALZADA GUADALUPE.		
	UBICACIÓN:	PRIVADA CALZADA GUADALUPE		
	ENTRE:	ANTIGUO CAMINO A NATIVITAS Y CALLE HIDALGO		

OPERADO FISM

	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	PONDERACIÓN DE CONCEPTOS	FECHA DE INICIO-TERMINO		
	PRELIMINARES	***16.36%***	***SUBTOTAL***		
1	TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: EQUIPÓ, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	0.73%	11-may-26	AL	09-jun-26
2	EXCAVACIÓN EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, NO INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SECO, TIPO II, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T	6.41%	11-may-26	AL	09-jun-26
3	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO LIGERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	8.03%	11-may-26	AL	09-jun-26
4	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL NO UTILIZABLE (PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O RETIROS Y/O DEMOLICIONES), FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	1.19%	11-may-26	AL	09-jun-26
	DRENAJE	***56.54%***	***SUBTOTAL***		
5	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYE ACARREO A SITIO AUTORIZADO POR PARTE DEL MUNICIPIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA EJECUCION	2.48%	11-may-26	AL	09-jun-26
6	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CON MANGUERA DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENO COMPACTADO, RETIRO, REPOSICIÓN DE TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	2.02%	11-may-26	AL	09-jun-26
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO N-8 DE 6" DE DIÁMETRO, NORMA "NOM-001-CNA-1995" PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS LOCALES, EXCAVACIONES, CONEXIÓN A RED, RELLENOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	7.06%	11-may-26	AL	09-jun-26
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO N-12 DE 12" DE DIÁMETRO, NORMA "NOM-001-CNA-1995" INCLUYE: LIGA-EMPAQUE, PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LABORATORIO, FLETES, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	28.64%	11-may-26	AL	09-jun-26
9	POZO DE VISITA DE MURO DE TAB. DE 0.25 M. A TIZÓN APL. PULIDO, DESPLANTE CONCRETO SIMPLE ESCALONES, DIAM. DE 0.60 A 0.90 M PROF. A RASANTE. HIDR. 1.50 M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	8.29%	11-may-26	AL	09-jun-26
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO PARA POZOS DE VISITA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	1.86%	11-may-26	AL	09-jun-26
11	CONEXIÓN A RED MUNICIPAL O POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	.53%	11-may-26	AL	09-jun-26
12	DEMOLICION DE REGISTRO SANITARIO DE 80 X 80 X 100 CM., INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	0.37%	11-may-26	AL	09-jun-26
	EXTRAORDINARIOS	***27.10%***	***SUBTOTAL***		
EXT-1	EXTRACCIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES ESTANCADAS EN POZOS Y ATARJEA MEDIANTE EL USO DE MOTOBOMBA TRAGA SÓLIDOS. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	1.88%	11-may-26	AL	09-jun-26
EXT-2	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON MANGUERA DE ALTA DENSIDAD, 35 ML INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENO COMPACTADO, RETIRO, REPOSICIÓN DE TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	0.62%	11-may-26	AL	09-jun-26

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

OBRAS PÚBLICAS

6.- CALENDARIO DE EJECUCIÓN

				FINAL
	MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA		DOP54/FAISMUN/AD26/007
	LOCALIDAD:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA		
	OBRA:	REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA CALZADA GUADALUPE.		
	UBICACIÓN:	PRIVADA CALZADA GUADALUPE		
	ENTRE:	ANTIGUO CAMINO A NATIVITAS Y CALLE HIDALGO		

OPERADO FISM

	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	PONDERACIÓN DE CONCEPTOS	FECHA DE INICIO-TERMINO		
EXT-3	LIMPIEZA, RETIRO DE ACUMULACIÓN DE SOLIDOS Y RENIVELACIÓN DE FONDO DE POZO DE VISITA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	0.30%	11-may-26	AL	09-jun-26
EXT-4	DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA ESPESOR DE 14 CM INCLUYE: EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	0.42%	11-may-26	AL	09-jun-26
EXT-5	DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE SECCION 14X50 CM, INCLUYE: EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	0.35%	11-may-26	AL	09-jun-26
EXT-6	RETIRO CON RECUPERACIÓN Y RECOLOCACIÓN DE ADOQUÍN INCLUYE: NIVELACION, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	2.39%	11-may-26	AL	09-jun-26
EXT-7A	FABRICACIÓN DE BANQUETA DE 14 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	0.79%	11-may-26	AL	09-jun-26
EXT-7B	FABRICACIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE SECCION 14X50 CM, INCLUYE: CIMBRA POR AMBAS CARAS, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	1.35%	11-may-26	AL	09-jun-26
EXT-8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHECK DE 12" PARA ALCANTARILLADO, INCLUYE: FABRICACIÓN DE REGISTRO SECCIÓN 1.20 X 0.80 X 0.60 M A BASE DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR, MUROS DE TABIQUE, ACABADO PULIDO, TAPA DE CONCRETO ARMADO, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	17.43%	11-may-26	AL	09-jun-26
EXT-9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26, IMPRESO EN VINIL LOS DATOS DE LA OBRA, TAMAÑO DE 30X45 CM CON DISEÑO Y COLORES OTROGADOS POR EL MUNICIPIO.	0.40%	11-may-26	AL	09-jun-26
EXT-10	DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS, CINTURÓN DE CONCRETO EXISTENTES, INCLUYE: ACARREO DISTANCIA MÁXIMA DE 10 M., TRASPALEOS HORIZONTALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	0.19%	11-may-26	AL	09-jun-26
EXT-11	CONSTRUCCIÓN DE CINTURÓN DE CONCRETO SIMPLE, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 10 X 25 CM DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRADO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	1.18%	11-may-26	AL	09-jun-26
		100.00%	11-may-26	AL	09-jun-26
	SUMA DE SUBTOTALES	$ 162,087.56			
	IVA	$ 25,934.01			
	TOTAL	$ 188,021.57			

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 SÍNDICO MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ... AXOCOMANITLA 2024 - 2027 OBRAS PÚBLICAS
