Transformando Axocomanitla
Gobierno Municipal 2024 - 2027

MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA

2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CLAVE EXPEDIENTE:	FINAL	DOP54/FAISMUN/AD26/011
FECHA ELAB.:	23 de julio de 2026	
MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA	
LOCALIDAD	SAN LORENZO AXOCOMANITLA	
UBICACIÓN:	SEGUNDA PRIVADA FRANCISCO VILLA SUR	
ENTRE:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MORELOS	
MBRE:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN SEGUNDA PRIVADA FRANCISCO VILLA SUR SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX.	
DESCRIP. METAS:	EXCAVACION EN CORTE, BASE HIDRAULICA PAVIMENTO DE ADOCRETO Y RENIVELACION DE REGISTROS	
UNIDAD MEDIDA:	M2	
CANTIDAD:	222.43	
TIPO DE PROYECTO		PIR
TIPO DE OBRA		PAVIMENTACION
RUBRO DEL GASTO		URB
MODALIDAD DEL PROYECTO		CONSTRUCCION
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO EN LA POBREZA(CARENCIA SOCIAL)		SERVICIOS URBANIZACION
AGEB		001-4
BENEF. DIRECTOS:	200	
HAB. DE LOCALIDAD:	6320	
FEDERAL:	$ -	
TATAL:	$ -	
BENEFICIARIOS:	$ -	
MUNICIPIO:	$ -	
COSTO TOTAL:	$ 167,255.47	
TOTAL PRESUPUESTO:	$ 167,255.47	
APORTACION BENEF:	NINGUNA	
MODALIDAD EJECUCION :	CONTRATO	
FECHA INICIO:	23 de junio de 2026	
FECHA TERMINO:	22 de julio de 2026	
PRESIDENTA MPAL:	LIC. GABRIELA HERNÁNDEZ MONTIEL PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	
DIRECTOR DE OBRAS:	ING. EDGAR ISRAEL AVENDAÑO VAZQUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SAN LORENZO AXOCOMANITLA PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 SÍNDICO MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA

2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Transformando Axocomanitla
Gobierno Municipal 2024 - 2027

EXPEDIENTE TÉCNICO

FINAL

FECHA DE ELABORACION: 23 de julio de 2026

CLAVE: DOP54/FAISMUN/AD26/011

A.- UBICACIÓN

MUNICIPIO: SAN LORENZO AXOCOMANITLA

LOCALIDAD: SAN LORENZO AXOCOMANITLA

UBICACIÓN: SEGUNDA PRIVADA FRANCISCO VILLA SUR

ENTRE: CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MORELOS

B.- OBRA A REALIZAR

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN SEGUNDA PRIVADA FRANCISCO VILLA SUR SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX.

DESCRIPCIÓN DE METAS:

EXCAVACION EN CORTE, BASE HIDRAULICA PAVIMENTO DE ADOCRETO Y RENIVELACION DE REGISTROS

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **CANTIDAD:** 222.47

C.- APERTURA PROGRAMÁTICA

TIPO DE PROYECTO:	PIR
TIPO DE OBRA	PAVIMENTACION
RUBRO DEL GASTO	URB
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO EN LA POBREZA(CARENCIA SC	SERVICIOS URBANIZACION
MODALIDAD DEL PROYECTO	CONSTRUCCION
AGEB	001-4

D.- BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 200 **HAB. DE LA LOCALIDAD:** 6320

E.- INVERSIÓN

TOTAL	0 FEDERAL	0 ESTATAL	0 BENEFICIARIOS	MUNICIPIO
167,255.47	0.00	0.00	0.00	167,255.47

FORMA DE APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS: NINGUNA

F.- EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATO

PERIODO: INICIO-TERMINO **DEL:** 23 de junio de 2026 **AL:** 22 de julio de 2026

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 TESORERIA

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. GABRIELA HERNANDEZ MONTIEL
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. EDGAR ISRAEL AVENDAÑO VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

2.- CROQUIS DE LA LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

			FINAL
MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA		DOP54/FAISMUN/AD26/011
LOCALIDAD:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA		
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN SEGUNDA PRIVADA FRANCISCO VILLA SUR SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX.		
UBICACIÓN:	SEGUNDA PRIVADA FRANCISCO VILLA SUR		
ENTRE:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MORELOS		

NORTE
PONIENTE ORIENTE
SUR

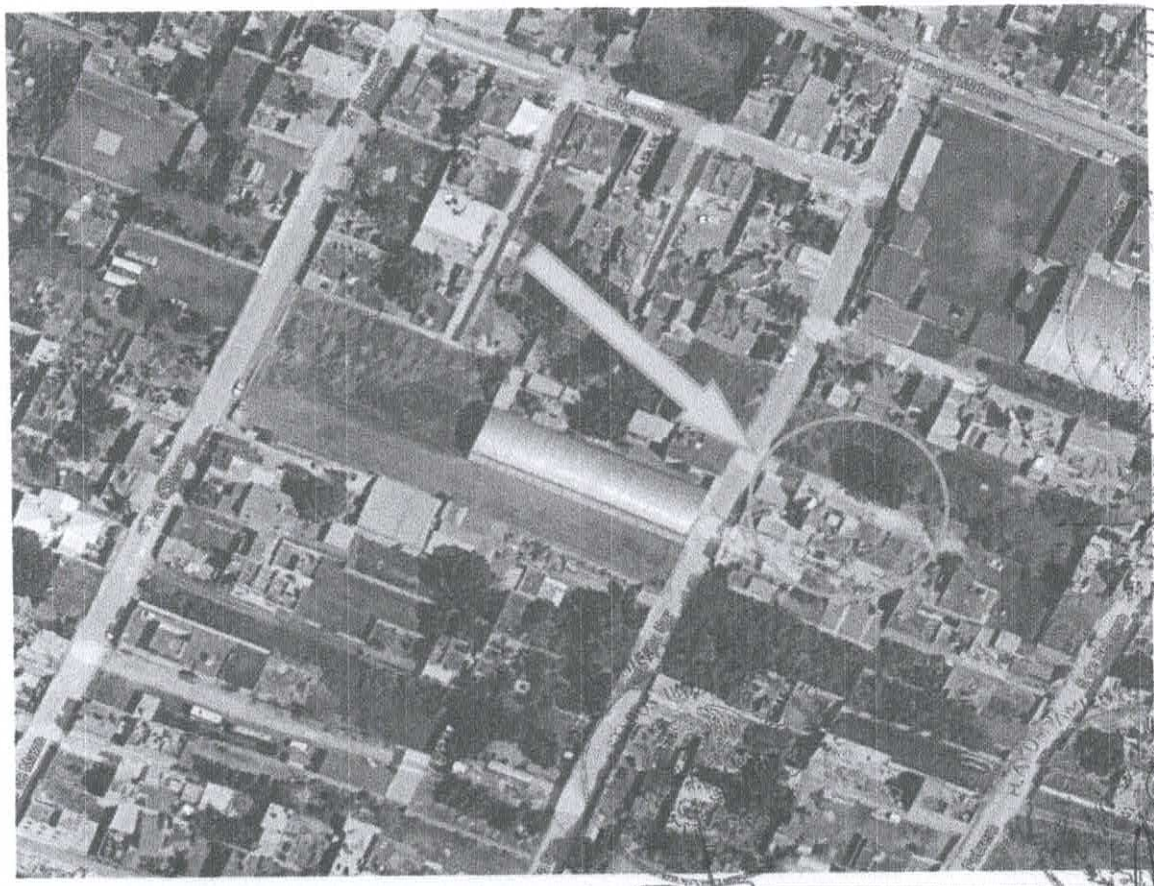


SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 TESORERÍA

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 SÍNDICO MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 OBRAS PÚBLICAS

3.- CROQUIS DE LA OBRA					
				FINAL	
MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA			DOP54/FAISMUN/AD26/011	
LOCALIDAD:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA				
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN SEGUNDA PRIVADA FRANCISCO VILLA SUR SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX.				
UBICACIÓN:	SEGUNDA PRIVADA FRANCISCO VILLA SUR				
ENTRE:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MORELOS				

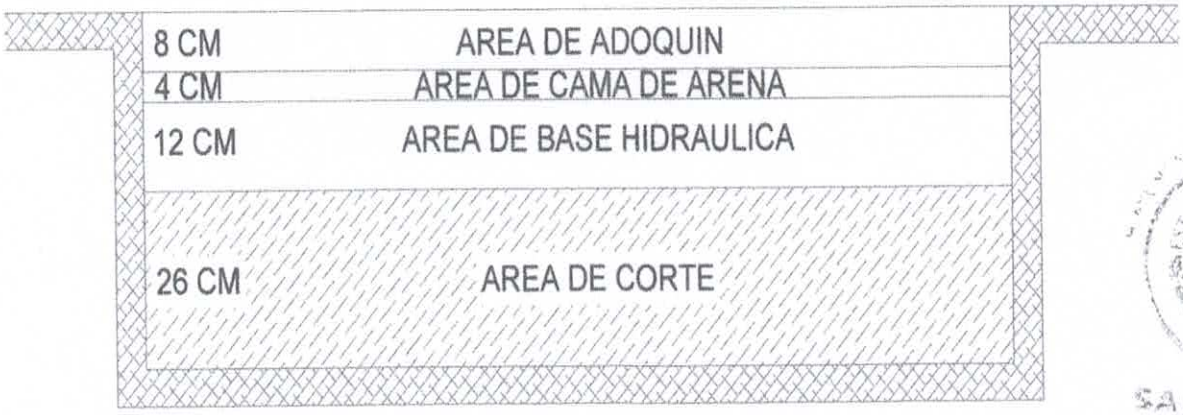

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 SÍNDICO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 OBRAS PÚBLICAS

3.1.- FOTOS				
				FINAL
MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA			DOP54/FAISMUN/AD26/011
LOCALIDAD:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA			
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN SEGUNDA PRIVADA FRANCISCO VILLA SUR SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX.			
UBICACIÓN:	SEGUNDA PRIVADA FRANCISCO VILLA SUR			
ENTRE:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MORELOS			



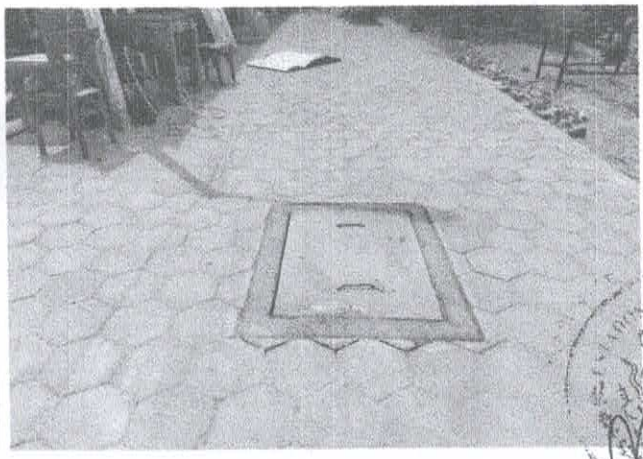

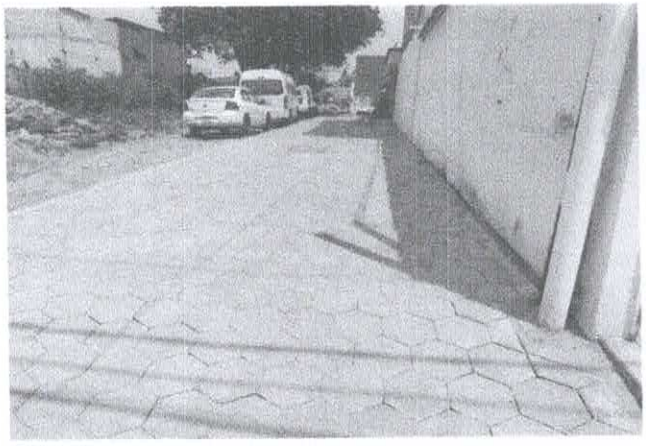

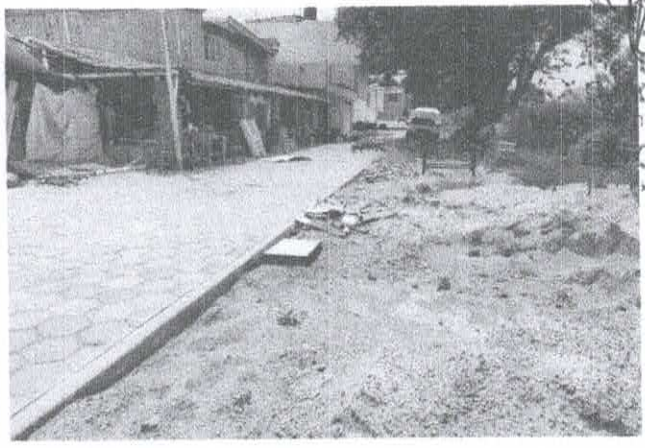

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LORENZO AXOCOMANITLA
2024 - 2027
SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LORENZO AXOCOMANITLA
2024 - 2027
OBRAS PÚBLICAS

4.- PRESUPUESTO DE LA OBRA

				FINAL		
	MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA		DOP54/FAISMUN/AD26/011		
	LOCALIDAD:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA				
	OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN SEGUNDA PRIVADA FRANCISCO VILLA SUR SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX.				
	UBICACIÓN:	SEGUNDA PRIVADA FRANCISCO VILLA SUR				
	ENTRE:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MORELOS				

		CONCEPTO O PARTIDA	U. DE M.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
		ADOQUINAMIENTO				
	1	TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS PARA CALLES INCLUYE: EQUIPÓ, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	222.43	$ 9.40	$ 2,090.84
	2	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, ACARREO LIBRE DE 20 M INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	54.54	$ 66.00	$ 3,599.64
	3	ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILÓMETRO, CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DE CORTES Y/O DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO , VOLUMEN MEDIDO EN SITIO P.U.O.T.	M3	75.37	$ 81.56	$ 6,147.18
	4	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL AL 85% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS., DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	218.17	$ 26.00	$ 5,672.42
	5	SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DE BASE HIDRÁULICA, LA GRANULOMETRÍA DEBERÁ TENER UN TAMAÑO MÁXIMO DE 38.1 MM (1 1/2") - 51 MM. (2"), Y UN PORCENTAJE DE FINOS MAT. <# 4 - #200, DE 10-15 MAX., LIMITE LIQUIDO DE 25 - 30 % MÁX., ÍNDICE PLÁSTICO DE 6.0 % MAX., EL PESO VOLUMÉTRICO SIN COMPACTAR ESTARÁ COMPRENDIDO ENTRE 1.600 A 1.700 TON/M3, INCLUYE: CARGAS Y ACARREOS, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA BASE COMPRENDIDA ENTRE 1.72 - 1.82 TON/M3, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	25.40	$ 639.53	$ 16,244.06
	6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN HEXAGONAL, 24 CM X 27.5 CM X 8 CM, ROJO INTENSO CON RESISTENCIA F'C=300 KG/CM2 MARCA PRALTEC O SIMILAR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 4 CM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	210.91	$ 357.13	$ 75,322.29
	7	CONSTRUCCIÓN DE CINTURON DE CONCRETO SIMPLE, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 10 X 25 CM DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRADO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	72.57	$ 207.77	$ 15,077.87
						$ 124,154.30

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 SINDICO MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 OBRAS PÚBLICAS

4.- PRESUPUESTO DE LA OBRA

				FINAL		
	MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA		DOP54/FAISMUN/AD26/011		
	LOCALIDAD:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA				
	OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN SEGUNDA PRIVADA FRANCISCO VILLA SUR SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX.				
	UBICACIÓN:	SEGUNDA PRIVADA FRANCISCO VILLA SUR				
	ENTRE:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MORELOS				

		CONCEPTO O PARTIDA	U. DE M.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
		COMPLEMENTARIA				
	8	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREOS DE ESCOMBROS MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	222.11	$ 9.99	$ 2,218.88
	9	RENIVELACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE 1.00 X 0.90 METROS, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y MARCO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,.	PZA	0.00	$ 1,303.49	$ -
	10	REPARACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTADO, RETIRO, REPOSICIÓN DE TUBERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	2.00	$ 1,331.10	$ 2,662.20
	11	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CON MANGUERA DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENO COMPACTADO, RETIRO, REPOSICIÓN DE TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	2.00	$ 369.26	$ 738.52
	12	SUMINISTRO Y COLOCACION PLACA DE LAMINA CON NOMBRE DE LA OBRA, PROGRAMA, MONTO Y META DE 0.45 M DE LARGO X 0.30 DE ALTO, CON DISEÑO Y COLORES OTORGADOS POR EL MUNICIPIO	PZA	1.00	$ 618.47	$ 618.47
						$ 6,238.07
		EXTRAORDINARIOS				
	EXT.01	RETIRO DE ADOQUÍN CUALQUIER FORMA EN PAVIMENTOS DE ADOCRETO VEHICULAR, INCLUYE:RECUPERACIÓN,LIMPIEZADELMISMO,APILÉ,SELECCIÓN DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN, MANIOBRALOCAL, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	25.60	$ 59.68	$ 1,527.81
	EXT.02	DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS, BANQUETA O VIALIDAD DE CONCRETO EXISTENTES, INCLUYE: ACARREO DISTANCIA MÁXIMA DE 10 M., TRASPALEOS HORIZONTALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	34.21	$ 37.14	$ 1,270.56

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 SÍNDICO MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 OBRAS PÚBLICAS

4.- PRESUPUESTO DE LA OBRA

				FINAL		
	MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA		DOP54/FAISMUN/AD26/011		
	LOCALIDAD:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA				
	OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN SEGUNDA PRIVADA FRANCISCO VILLA SUR SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX.				
	UBICACIÓN:	SEGUNDA PRIVADA FRANCISCO VILLA SUR				
	ENTRE:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MORELOS				

	CONCEPTO O PARTIDA		U. DE M.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	EXT.03	RENIVELACION Y TAPA DE CONCRETO 250 KG/CM2 PARA REGISTRO DE 0.65 X 0.90 cms DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLADE 1/2, INCLUYE: COLOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	4.00	$ 1,924.10	$ 7,696.40
	EXT.04	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLON DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2 DE 10.00X10.00 CM DE SECCIÓN INCLUYE: COLADO, CIMBRADO, DECIMBRADO, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	15.60	$ 211.45	$ 3,298.62
						$ 13,793.39
					SUBTOTAL	**$ 144,185.75**
					IVA	**$ 23,069.72**
					TOTAL	**$ 167,255.47**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LORENZO AXOCOMANITLA
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LORENZO AXOCOMANITLA
2024 - 2027
SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LORENZO AXOCOMANITLA
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LORENZO AXOCOMANITLA
2024 - 2027
OBRAS PÚBLICAS

5.- RESUMEN DE CONCEPTOS

			FINAL
	MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA	DOP54/FAISMUN/AD26/011
	LOCALIDAD:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA	
	OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN SEGUNDA PRIVADA FRANCISCO VILLA SUR SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX.	
	UBICACION:	SEGUNDA PRIVADA FRANCISCO VILLA SUR	
	ENTRE:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MORELOS	

CONCEPTO Ó PARTIDA	IMPORTE C/IVA
ADOQUINAMIENTO	$ 144,018.99
COMPLEMENTARIA	$ 7,236.16
EXTRAORDINARIOS	$ 16,000.33
TOTAL	$ 167,255.47

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 SÍNDICO MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 OBRAS PÚBLICAS

6.- CALENDARIO DE EJECUCIÓN

			FINAL
MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA		DOP54/FAISMUN/AD26/011
LOCALIDAD:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA		
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN SEGUNDA PRIVADA FRANCISCO VILLA SUR SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX.		
UBICACIÓN:	SEGUNDA PRIVADA FRANCISCO VILLA SUR		
ENTRE:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MORELOS		

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	PONDERACIÓN DE CONCEPTOS	FECHA DE INICIO-TERMINO		
ADOQUINAMIENTO	***86.11% SUBTOTAL***			
TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS PARA CALLES INCLUYE: EQUIPÓ, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	1.45%	23-jun-26	AL	22-jul-26
EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, ACARREO LIBRE DE 20 M INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	2.50%	23-jun-26	AL	22-jul-26
ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILÓMETRO, CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DE CORTES Y/O DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO , VOLUMEN MEDIDO EN SITIO P.U.O.T.	4.26%	23-jun-26	AL	22-jul-26
COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL AL 85% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS., DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA.	3.93%	23-jun-26	AL	22-jul-26
SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DE BASE HIDRÁULICA, LA GRANULOMETRÍA DEBERÁ TENER UN TAMAÑO MÁXIMO DE 38.1 MM (1 1/2") - 51 MM. (2"), Y UN PORCENTAJE DE FINOS MAT. <# 4 - #200, DE 10-15 MAX., LIMITE LIQUIDO DE 25 - 30 % MÁX., ÍNDICE PLÁSTICO DE 6.0 % MAX., EL PESO VOLUMÉTRICO SIN COMPACTAR ESTARÁ COMPRENDIDO ENTRE 1.600 A 1.700 TON/M3, INCLUYE: CARGAS Y ACARREOS, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA BASE COMPRENDIDA ENTRE 1.72 - 1.82 TON/M3, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	11.27%	23-jun-26	AL	22-jul-26
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN HEXAGONAL, 24 CM X 27.5 CM X 8 CM, ROJO INTENSO CON RESISTENCIA F'C=300 KG/CM2 MARCA PRALTEC O SIMILAR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 4 CM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	52.24%	23-jun-26	AL	22-jul-26
CONSTRUCCIÓN DE CINTURÓN DE CONCRETO SIMPLE, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 10 X 25 CM DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRADO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	10.46%	23-jun-26	AL	22-jul-26
COMPLEMENTARIAS	***4.33% SUBTOTAL***			
LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA, INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREOS DE ESCOMBROS MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	1.54%	23-jun-26	AL	22-jul-26
RENIVELACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE 1.00 X 0.90 METROS, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y MARCO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,.	0.00%	23-jun-26	AL	22-jul-26

6.- CALENDARIO DE EJECUCIÓN

			FINAL
MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA		DOP54/FAISMUN/AD26/011
LOCALIDAD:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA		
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN SEGUNDA PRIVADA FRANCISCO VILLA SUR SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX.		
UBICACIÓN:	SEGUNDA PRIVADA FRANCISCO VILLA SUR		
ENTRE:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MORELOS		

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	PONDERACIÓN DE CONCEPTOS	FECHA DE INICIO-TERMINO		
REPARACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTADO, RETIRO, REPOSICIÓN DE TUBERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	1.85%	23-jun-26	AL	22-jul-26
REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CON MANGUERA DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENO COMPACTADO, RETIRO, REPOSICIÓN DE TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	0.51%	23-jun-26	AL	22-jul-26
SUMINISTRO Y COLOCACION PLACA DE LAMINA CON NOMBRE DE LA OBRA, PROGRAMA, MONTO Y META DE 0.45 M DE LARGO X 0.30 DE ALTO, CON DISEÑO Y COLORES OTORGADOS POR EL MUNICIPIO	0.43%	23-jun-26	AL	22-jul-26
EXTRAORDINARIOS	***9.57%***	***SUBTOTAL***		
RETIRO DE ADOQUÍN CUALQUIER FORMA EN PAVIMENTOS DE ADOCRETO VEHICULAR, INCLUYE:RECUPERACIÓN,LIMPIEZADELMISMO,APILÉ,SELECCIÓN DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN, MANIOBRALOCAL, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	1.06%	23-jun-26	AL	22-jul-26
DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS, BANQUETA O VIALIDAD DE CONCRETO EXISTENTES, INCLUYE: ACARREO DISTANCIA MÁXIMA DE 10 M., TRASPALEOS HORIZONTALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	0.88%	23-jun-26	AL	22-jul-26
RENIVELACION Y TAPA DE CONCRETO 250 KG/CM2 PARA REGISTRO DE 0.65 X 0.90 cms DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLADE 1/2, INCLUYE: COLOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	5.34%	23-jun-26	AL	22-jul-26
CONSTRUCCIÓN DE DENTELLON DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2 DE 10.00X10.00 CM DE SECCIÓN INCLUYE: COLADO, CIMBRADO, DECIMBRADO, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	2.29%	23-jun-26	AL	22-jul-26
	100.00%	23-jun-26	AL	22-jul-26
SUMA DE SUBTOTALES	**$ 144,185.75**			
IVA	**$ 23,069.72**			
TOTAL	**$ 167,255.47**			

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 SÍNDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 OBRAS PÚBLICAS
